

台灣海外援助發展聯盟  
尼泊爾災後重建  
「社區發展中心旗艦型計畫」

結案報告



聯絡人：李尚林秘書長  
電話：(02) 2719-0408 分機 235；[linus@nnclf.org](mailto:linus@nnclf.org)

# 尼泊爾災後重建「社區發展中心旗艦型計畫」結案報告

## 壹、 前言

南亞國家尼泊爾位於喜馬拉雅山下，國境呈西北-東南走向的長方形，國土面積約 15 萬平方公里，為台灣四倍大，北鄰中國西藏，另三面則與印度相鄰。尼泊爾地形多變，境內有超過四分之一的土地，都是海拔 3,000 公尺以上的高山，單是喜馬拉雅山區就占總面積約 15%，中部也以丘陵及山谷為主，整體山地佔全國面積四分之三以上，因而有「山國」之稱。尼泊爾於 2015 年 4 月 25 號發生地震，芮氏規模高達 7.8，緊接著 5 月 12 日又再次發生 7.3 級地震，連續兩次震災造成嚴重傷亡，受波及範圍包括尼泊爾、印度北部、巴基斯坦、孟加拉國、不丹和中國西藏部分區域。根據美國國家發展總署（USAID）的資料，大地震共造成尼泊爾當地超過 8000 人死亡，7000 人受傷，3300 餘棟房屋倒塌，更使 800 萬人成為災民，損失非常慘重。

為了幫助尼泊爾大丁地區早日重建家園，Taiwan AID 計畫與尼泊爾非政府組織 Ecological Protection Forum（以下簡稱 EPF）合作，以「社區發展中心」（Community Development Center, CDC）作為災後重建及社區發展的示範標竿計畫，本計畫的核心「社區發展中心」，將設計成為多功能空間，包括婦幼教室、電腦教室、行動醫療儲藏室，生態旅遊資訊站，以及大型會議室可供召開居民大會並兼防災功能等，更將引入台灣先進的太陽能發電技術，以永續發展的理念協助尼泊爾災民重建生活，該中心更將設計具有防震及避難功能，提供當地村民安全的避難空間，以應付未來各樣的天然災難。

社區發展中心建設完成後，不僅對當地社區產生極大功效，更將提供完善設施，嘉惠我國非政府組織及公部門前往尼泊爾推展人道援助工作。例如公衛教室將可做為未來台灣醫療義診團隊的工作空間，電腦教室則可做為台灣國際青年志工之服務場地，對於我國在尼泊爾的人道醫療及教育工作將有極大助益。

本次計畫的合作夥伴為尼泊爾當地非政府組織 EPF，其創辦人 Mr. Ramesh Prasad Dhamala 為前任國會議員，目前擔任中央政府之「鄉村供水及衛生基金發展委員會」理事，並為該國生態旅遊發展協會的會長，為尼國社會知名人士。在他的領導之下，EPF 長期投入大丁地區的教育及公共衛生推廣工作，並與德國、加拿大、韓國等國際非政府組織合作，對於執行國際合作方案具有豐富經驗。

因此，本計畫希望透過建立社區發展中心，在大丁地區推動衛生及資訊教

育，並協助推廣生態旅遊，協助災民不僅早日重建家園，更透過災後重建的契機，以永續發展的方式，提升大丁地區的教育、醫療及生活水準，並為台灣及尼泊爾未來的國際合作方案打下堅實的基礎。

**貳、指導單位：外交部**

**參、主辦單位：台灣海外援助發展聯盟**

**肆、合辦單位：Ecological Protection Forum, Nepal (EPF-NEPAL)**

**伍、執行期間：2015 年 12 月至 2017 年 5 月**

**陸、計畫地點：尼泊爾大丁地區（Dhading）BP Guan**

**柒、計畫成果**

1. 新建一棟 2.5 層樓之多功能社區發展中心，預計受益人數超過 3500 人，該中心設有婦幼教室、電腦教室、公衛教室、公共集會場所、緊急避難場所等提供社區發展多用途所需。
2. 購置太陽能板，安裝於社區發展中心之樓頂，提供乾淨能源，做為該地區發展生態環境旅遊的示範基地。
3. 購置社區發展中心內部基本設備及傢俱，並提供營運費用，讓社區發展中心確實投入使用，發揮功能。
4. 拍攝紀錄片一部，忠實紀錄台灣援助尼泊爾的災後重建過程。

**捌、 計畫執行大事記：**

日期	工作內容	說明
2015/12/31	簽署 MOU，匯出第一期款台幣 250 萬元	
2016/1/18	舉辦社區發展中心開工典禮	由本聯盟王金英理事長參加
1/1-4/30	一樓地坪，牆面完成，主體結構百分之五十完成	CDC 硬體建設由 EPF Nepal 執行，Taiwan AID 負責監督及追蹤方案進度。
5/1-5/7	釘二樓地坪母版及綁鋼筋	
5/8	二樓地坪灌漿完成	
5/9-29	二樓牆面完成	
5/30-6/2	釘二樓屋頂母版及綁鋼筋	
6/3	二樓屋頂灌漿完成	
6/4-6/15	整理外牆，完成主建築結構	雨季 6 月中旬開始
6/20	匯出第二期款台幣 200 萬元	
6/16-9/15	內牆水泥粉刷	雨季進度緩慢
9/16-11/15	一樓地基加強，路面鋪設鵝卵石預防土石流	節慶放假兩週
11/16-12/15	頂樓加蓋餐廳，廁所，二樓走廊圍牆，樓頂圍牆	周邊道路拓寬
12/16-12/30	鋪設室內地板及地毯，牆面粉刷，無障礙通道	太陽能板安裝
2017/1/1-1/7	布置環境，購買基本家具	架設開幕舞台
1/9	開幕完工典禮	由外交部周麟大使及 Taiwan AID 王金英理事長參加並揭牌
1/10	匯出第三期款台幣 432,075 元	
5/9	匯出第四期款台幣 50 萬元	方案尾款

## 玖、 計畫過程簡述

### ■ NGO 與政府齊心協力克服困難 嶄新社區發展中心順利完工啟用

本案自 2015 年年底啟動之後，Taiwan AID 扮演資源連結及執行監督平台的角色，透過外交部的贊助，並連結尼泊爾當地非政府組織 EPF，在有限的經費下，順利興建完成一棟 2.5 層樓的多功能社區發展中心。該中心可提供各種活動空間，例如舉辦公共衛生教育活動、婦女幼兒活動、社區集會等，並有大型避難空間，提供地震及其他災害發生時的安全避難空間。

本案執行期間，遭逢印度關閉邊界、物資價格大漲、政府政黨輪替導致政局不穩等多項困難，但仍在政府及 NGO 夥伴的齊心協力下讓社區發展中心順利完工啟用，以有限資源發揮最大效能，造福災區民眾，成為台灣援助尼泊爾災後重建最耀眼的亮點成果。

### ■ 落實永續發展目標 Taiwan AID 以夥伴關係幫助尼國重建家園

Taiwan AID 連結尼泊爾當地 NGO 夥伴 EPF，由 Taiwan AID 負責資源連結及方案監督評估，由 EPF 負責尼泊爾當地之方案執行，本合作模式非常成功，透過 Taiwan AID 與 EPF 高效率及信任的合作模式，順利按照計畫期程興建完成社區發展中心；EPF 每月按時繳交進度報告及最新照片，計畫過程中遭遇突發狀況（例如印度關閉邊界導致物價上漲）時雙方充分溝通，Taiwan AID 以聯合國永續發展目標第十七項「永續發展的夥伴關係」做為核心價值，與 EPF 順利克服各項困難，不僅讓方案順利完成，也切實實踐聯合國永續發展目標，做為未來台灣推動各項國際援助工作的典範。

### ■ 懸掛我國國旗及 Taiwan AID 字樣 彰顯來自台灣的愛心

本案做為台灣援助尼泊爾之旗艦計畫，因此特地於社區發展中心設置感謝牌，標誌我國國旗及 Taiwan AID 字樣，說明該中心之興建費用均來自於台灣人民的愛心，同時為了彰顯台灣援助尼泊爾的善舉，本案也特地邀請外交部 NGO 委員會執行長周麟大使及 Taiwan AID 王金英理事長等貴賓參與完工啟用典禮，共同為我國國旗及 Taiwan AID 字樣揭牌，見證台灣援助尼泊爾災後重建的成果。

### ■ 舉辦多項培力活動 該中心已成為社區重要據點

本方案之社區發展中心硬體完工之後，已開始投入使用並舉辦多項活動，

包括婦女培力活動、社區集會等，幫助當地居民學習最新知識及技能，Taiwan AID 也贊助該中心之營運費用，EPF 亦已設計安排未來多項定期活動及培力課程，使該中心成為當地最重要的活動據點，發揮本計畫所大效能。

## 拾、 未來建議

### ■ 社區發展中心可做為台灣援助亮點 後續資源需繼續投入

本案於 2017 年 1 月正式完工啟用之後，已陸續舉辦多項活動。展望未來發展，建議以社區發展中心為核心據點，邀集台灣 NGO 及青年志工團體加入後續計畫，進行醫療、教育、婦女、公共衛生、社區營造等方案，Taiwan AID 可扮演平台整合角色，提供資訊及資源，由台灣各 NGO 團隊進駐服務，我國政府亦可投入後續資源，支持當地重建發展，做為台灣在尼泊爾人道援助的亮點櫥窗，展現台灣民間及政府對於當地援助發展工作的成果。

拾壹、計畫執行照片



2015年7月 Taiwan AID 前往當地探勘，險遭翻車事故，驚險萬分

engineer measurement

CDC 建築基地初步整地完成



本聯盟王金英理事長(左二)於 2016 年 1 月前往大丁參加 CDC 開工典禮




鋼筋施工中



完成一樓牆面，立門框和窗框



CDC 施工中

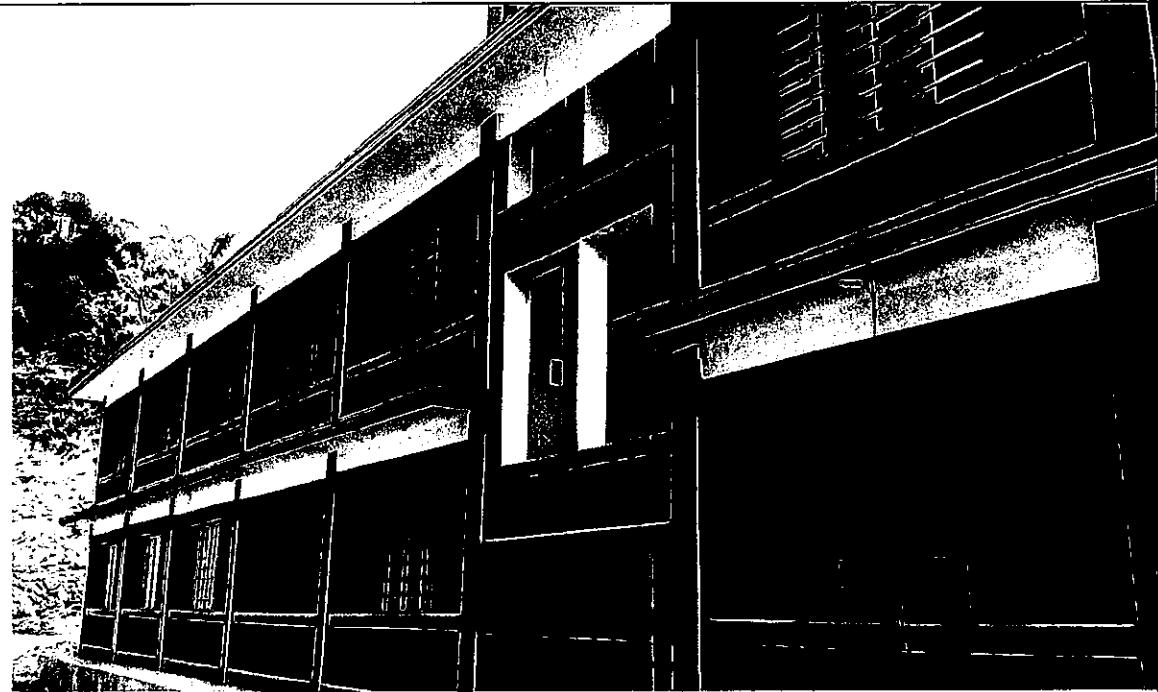


嶄新2.5層樓之社區發展中心正式完工啟用



社區發展中心之走樓及空間配置



走廊以富有尼泊爾當地特色之紋路砌造而成

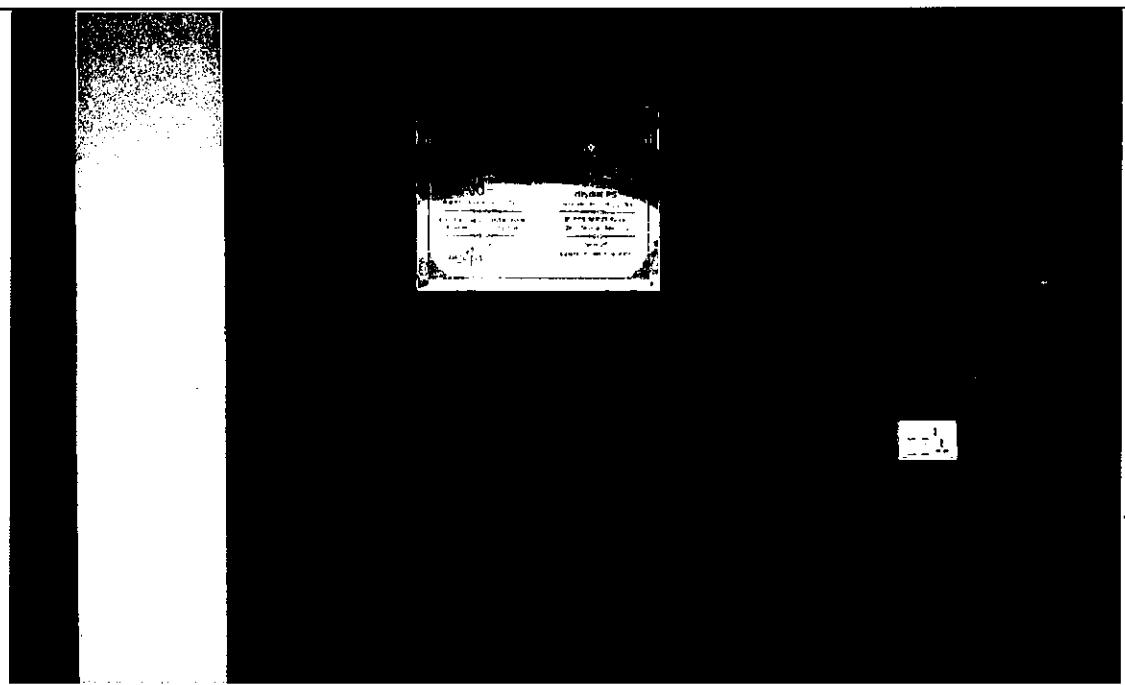

我國國旗及 Taiwan AID 字樣標示來自台灣人民的愛心援助尼泊爾災後重建



本聯盟王金英理事長(左三)、外交部 NGO 國際事務會周麟大使(左二)親赴尼泊爾參加 CDC 落成典禮




舉辦婦女培力活動



舉辦社區聚會及活動



社區發展中心成為當地最重要的活動舉辦地點

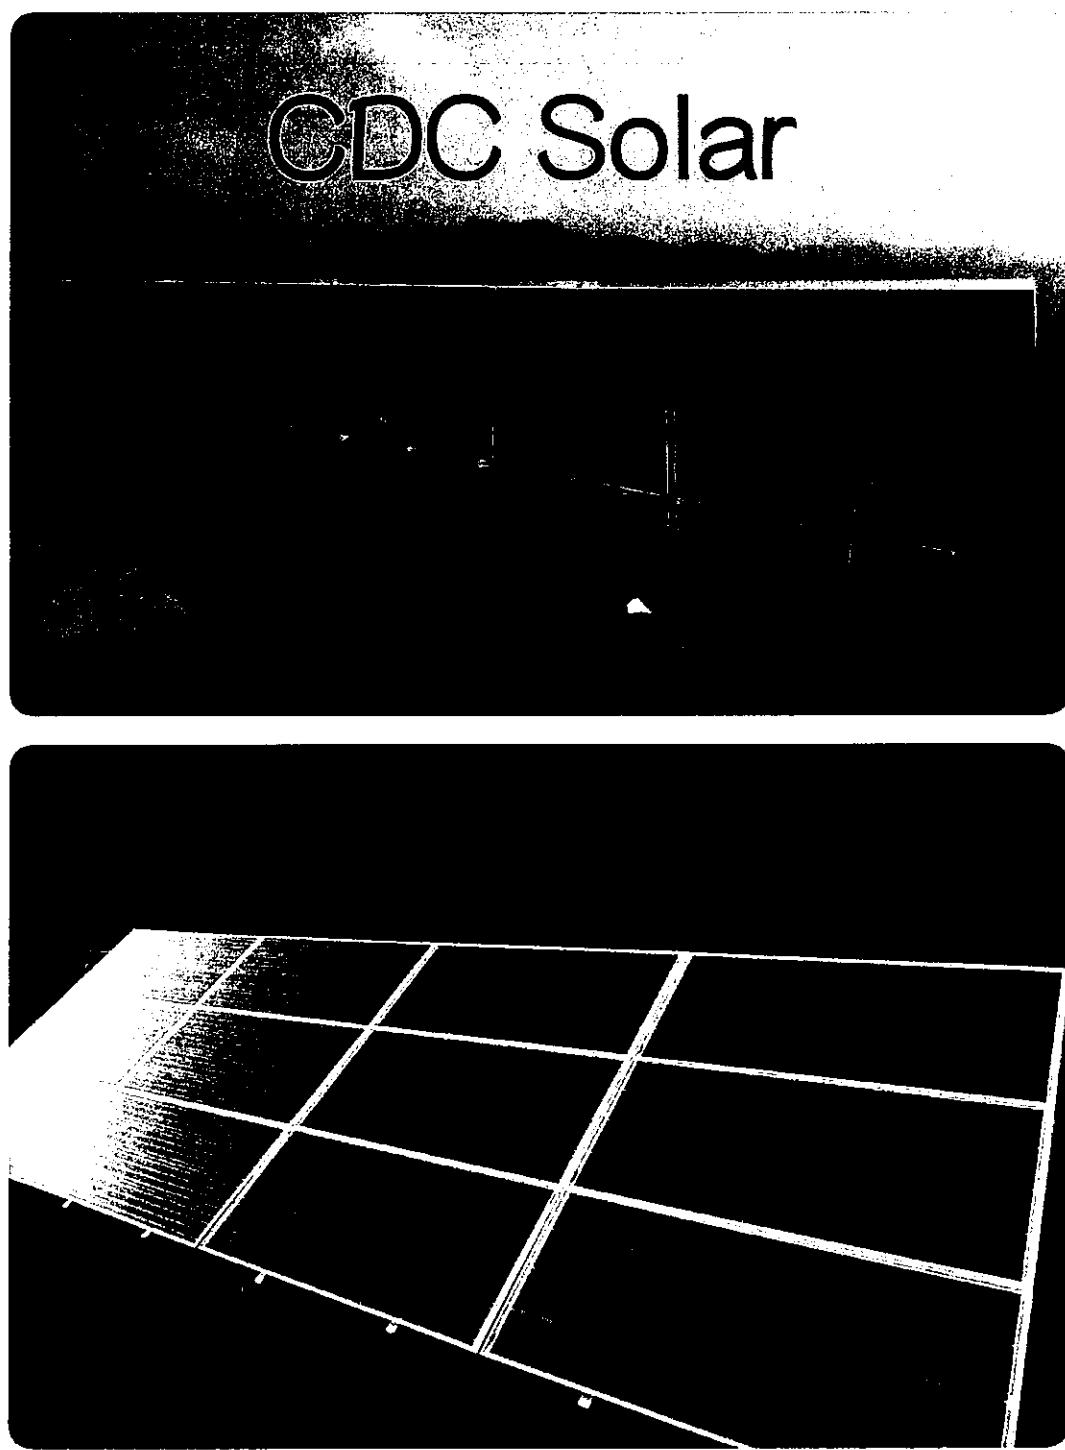

於社區發展中心樓頂設置太陽能板，提供乾淨能源


## 附件一：社區發展中心活動安排及規劃

說明：


- 電腦教室的使用，六月以前開放給附近的兩所高中申請免費使用時段，由各學校電腦老師教學。針對 SLC 學生(高中聯考學生)，開設密集課程，尼文輸入，英文輸入，及電腦基礎課，師資由 EPF 支付。七月，元智國際志工進行一個月的電腦營，加裝 WIFI 設備，並捐贈華碩筆電給這兩所高中。秋季課程安排在學校放假一個月的假期中，一星期密集(中或英)語言，一星期密集基礎電腦(含上網)，安排國際志工教學。
- 保健室(一樓)由固定的員工 HW 駐點服務，婦女衛教室(二樓)不定期邀請當地專家開座談會。每個月設定不同主題，安排政府及其他 INGO 專家等一起舉行。
- 訓練室，前半年配合民宿建造，由政府工程師，EPF 專員進行防震建築培訓及實地示範，並推廣當地婦女的手工藝訓練和工匠技藝傳承。下半年主題以觀光培訓為主，包含有機農業，特色餐飲，基本服務禮儀為主。申請 INGO 提供師資。

房間	辦公室	大會議室	保健室主題	電腦教室	訓練室
冬天，是主要的乾季。					
1月	行政	BP GAUN Eco	蒐集居民基本	學校登記	防震環保
2月	社區發	Tourism	資料家訪：孕婦	免費使用	建築培訓
3月	展	CDC 攝影靜態展	新生兒，學齡	尼文輸入班	工匠技巧傳
4月	太陽能	每月會議	前兒童，老人。	電腦基礎班	授
	充電站	新年慶祝活動	急救訓練		手工藝訓練
雨季，也是農忙季節，七八月是大雨季，學校停課一個月。是主要的訓練期。					
5月	行政	觀光表演	性教育	SLC 英尼輸	防震環保
6月	社區發	歌舞訓練	預防傳染病	入班	建築培訓
	展	每月會議		電腦基礎班	
7月	太陽能	婚禮場地租借	安全飲水	暑期電腦營	國際志工住
8月	充電站	● 休館整修	居家衛生	收費使用	宿
9月			社區大掃除	Internet 熱點	(YZU)
秋天，是尼國的重要節日(達善節 DASHAIN 和 TIHAR)，也是結婚旺季。					
10月	行政	社區年度會議	行動醫療	收費課程	有機農業
11月	太陽能	社區媽媽聯誼會		電腦&語言	觀光培訓
12月	充電站	達善節慶祝活動		培訓班	特色餐飲
	旅遊資訊	婚慶場地租借		(AUSU 國際志工)	基本服務

## 附件二：樓層使用圖

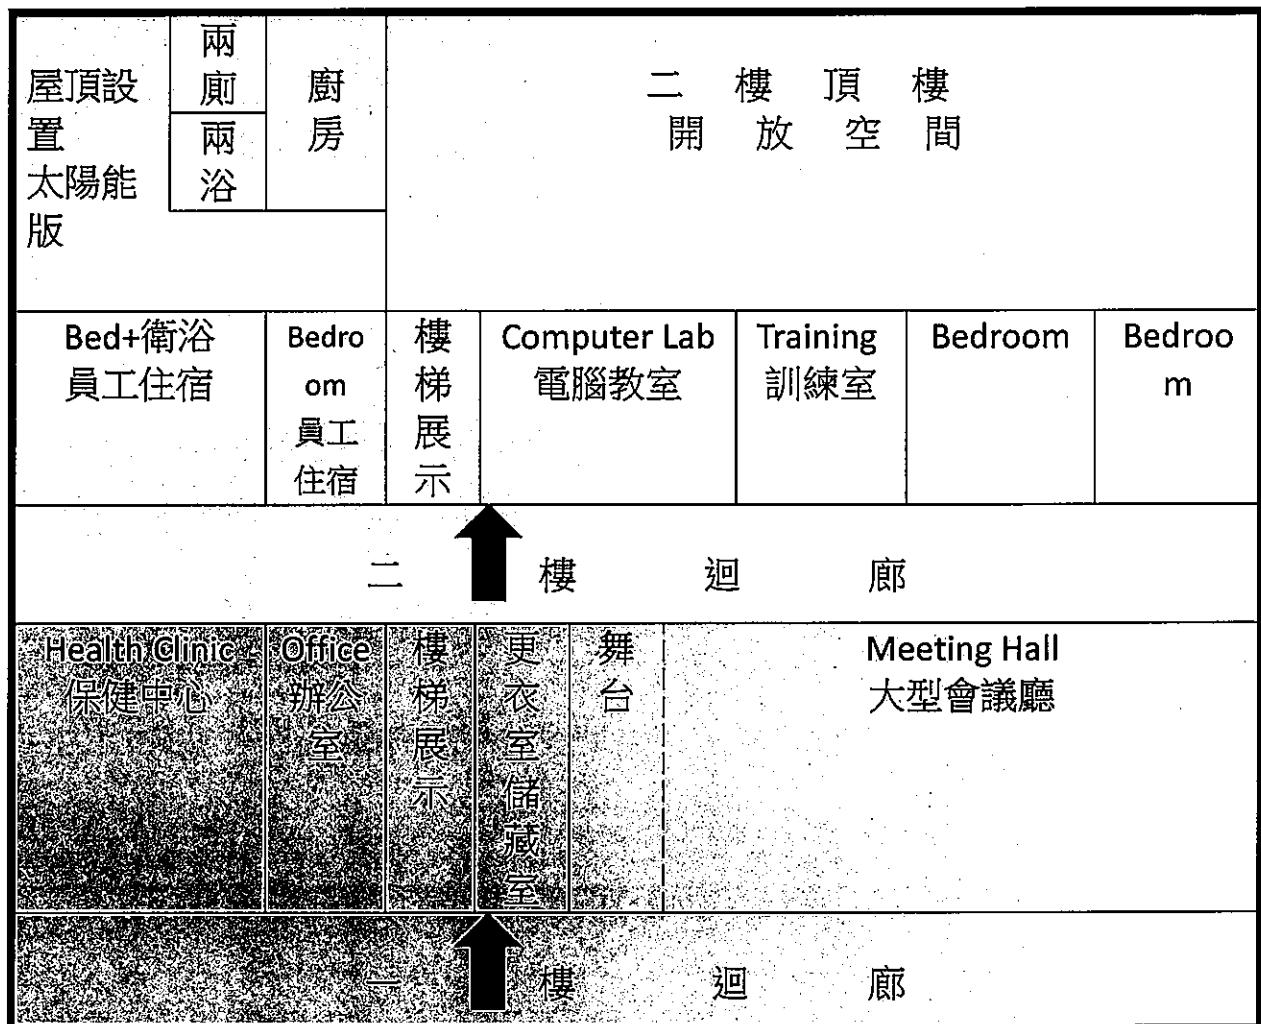

## 附件三：感謝標誌圖樣



## COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER

BP Gaun, Madhuban, Neelkantha-13, Dhading, Nepal

Donated by:

**Taiwan Aid**  
Taiwan Alliance in International Development

Inauguration Date: 9th January, 2017 A.D.

*It is a token of love and friendship  
from the people of Taiwan.*

Constructed by:

**EPF Nepal**  
Ecological Protection Forum-Nepal

## सामुदायिक विकास केन्द्र

बीपी गाउँ, मधुवन, निलकण्ठ-१३, धादिङ, नेपाल

दाता:

## ताइवान एड

उद्घाटन मिति: पौष २५, २०७३ बि.स.

यो ताइवानबाटीको तर्फबाट  
प्रेम र मित्रताको चिनो हो।

निर्माण गर्ने:

पर्यावरण संरक्षण मञ्च-नेपाल



## बीपी गाउँ पर्यावरण पर्यटन परियोजना BP GAUN ECO-TOURISM PROJECT



नेपाली कॉग्रेसका महामन्त्री माननीय प्रा. डा. शशांक कोइरालाज्यू द्वारा

बीपी गाउँ मधुवन, निलकण्ठ-१३, धादिङमा अवस्थित

सामुदायिक विकास केन्द्रको भवन समुद्धाटन सु-सम्पन्न भयो।

मिति: २०७३ पौष २५ गते

Inauguration of Community Development Center Building  
at BP Gaun Madhuban, Neelakantha-13, Dhading in Presence of

General Secretary of Nepali Congress,

**Hon. Pro. Dr. Shasanka Koirala**

on 9th January 2017

Donated by

**Taiwan AID**

(Taiwan Alliance in International Development)

Constructed by

**EPF-NEPAL**

(Ecological Protection Forum, Nepal)
